

COMUNE DI MOSCHIANO

PROVINCIA DI AVELLINO


DITTA: Azienda Sanitaria Locale Avellino

**INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI MOSCHIANO"
CUP: H53D22000140001**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ALLEGATO **GEN 05: Cronoprogramma lavori**

Data:
DICEMBRE 2022



Progettisti

ING. ANTONIO CARRATURO



Ing. Antonio Carraturo -via Casale 8, 83100 Avellino – email: antonio.carraturo@strutturaepiano.it

ALLEGATO "A"

Comune di Moschiano
Provincia di Av

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2 - IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI MOSCHIANO" - CUP: H53D22000140001 - CIG: Z9B38822E0

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino.

CANTIERE: "Parco degli Ulivi" - Strada Statale 403 - , Moschiano (Av)

Moschiano, 20/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Carraturo Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(\$EMPTY_COM_11\$ \$EMPTY_COM_10\$ \$EMPTY_COM_09\$)

Ingegnere Carraturo Antonio


Via Casale 8
83100 Avellino (Av)
Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: antonio.carraturo@strutturaepiano.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività		Durata																				
Recinzione e apprestamenti del cantiere		4 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere		2 g																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e		3 g																				
Montaggio del ponteggio metallico fisso		4 g																				
Impianti di servizio del cantiere		6 g																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere		3 g																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere		5 g																				
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic		2 g																				
pulizia area di cantiere		1 g																				
Pulizia generale dell'area di cantiere		1 g																				
Pulizia di sede stradale		1 g																				
Pulizia di ambienti o piani antichi già scavati		1 g																				
scavo per adduzione energia elettrica e alimentazione idrica		1 g																				
Scavo a sezione obbligata		1 g																				
Posa di conduttura elettrica		1 g																				
Posa di conduttura telefonica		1 g																				
Posa di conduttura idrica		1 g																				
Rinfilanco con sabbia eseguito a mano		1 g																				
Rinterro di scavo eseguito a macchina		1 g																				
Spicconatura intonaco esterno		6 g																				
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro		6 g																				
impermealizzazione copertura		5 g																				
Perforazioni in elementi opachi		1 g																				
Applicazione di vernice protettiva su copertura		2 g																				
Impermeabilizzazione di coperture		3 g																				
posa motocondensanti esterne in copertura		4 g																				
Posa della macchina di condizionamento		4 g																				
Demolizione murature chiusure vani finestre		3 g																				
Demolizione di tamponature eseguita a mano		3 g																				
Intonaci in facciata		21 g																				
Formazione intonaci esterni tradizionali		9 g																				
Rasatura di intonaci esterni		7 g																				
Tinteggiatura di superfici esterne		5 g																				
Montaggio porte e infissi esterni		9 g																				
Montaggio di porte per esterni		2 g																				

[illegible]

20	Mar 23				27 Mar 23				03 Apr 23				10 Apr 23				17 Apr 23				24 Apr 23				01 Mag 23				08 Mag 23				15 Mag 23				22 Mag 23				29 Mag 23				05 Giu 23				12 Giu 23				19 Giu 23				26 Giu 23				03 Lug 23															
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06

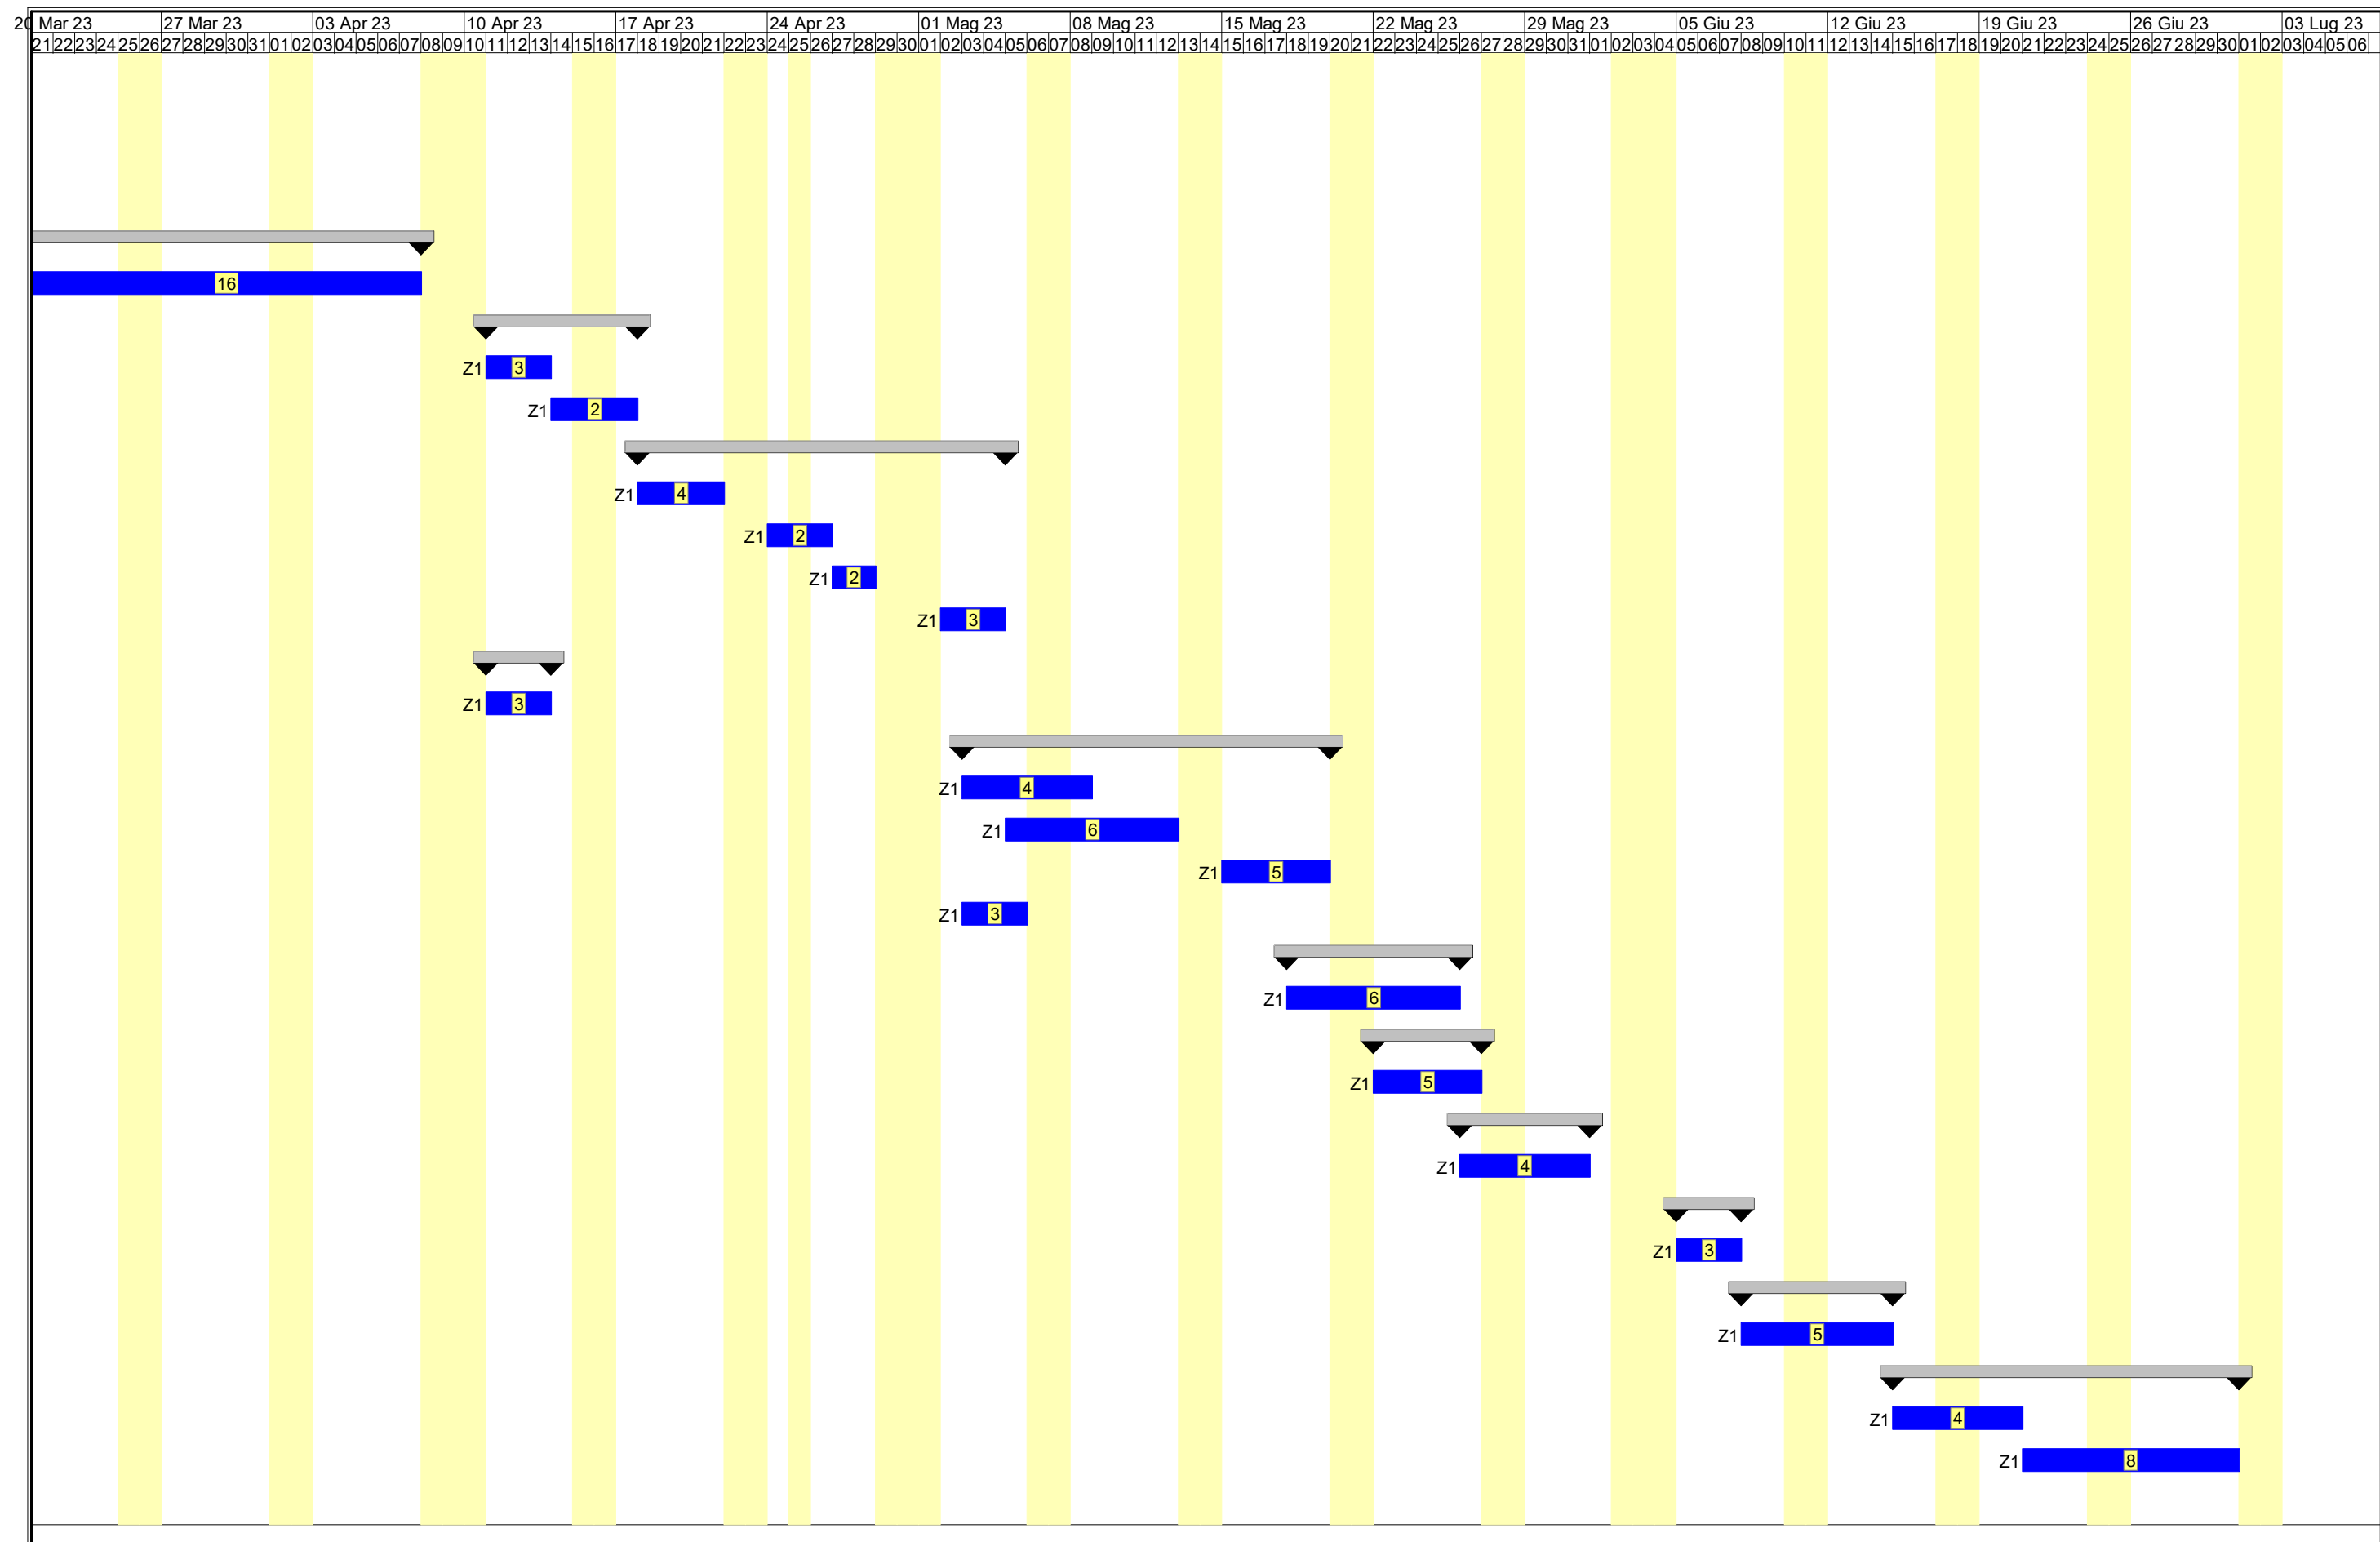

21	Mar 23			27 Mar 23			03 Apr 23			10 Apr 23			17 Apr 23			24 Apr 23			01 Mag 23			08 Mag 23			15 Mag 23			22 Mag 23			29 Mag 23			05 Giu 23			12 Giu 23			19 Giu 23			26 Giu 23			03 Lug 23																															
22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06
